Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Carreleur, veuillez visiter :
bpcarreleur.fr/annales-sujets-et-corriges

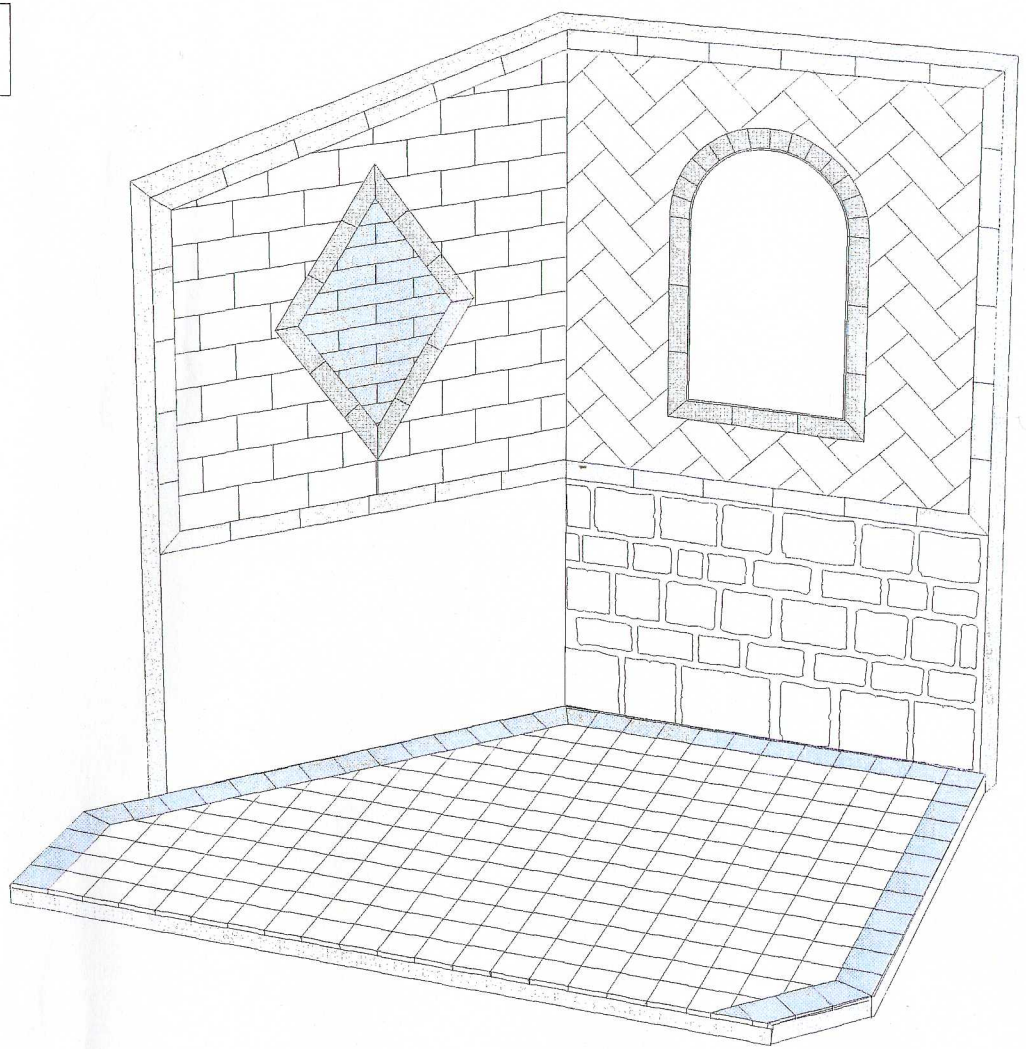
BREVET PROFESSIONNEL
CARRELAGE MOSAIQUE

ETUDE ET REALISATION DE MISE EN OEUVRE

EPREUVE E2 DUREE 20H

CONTENU DU DOSSIER

- Présentation de l'ouvrage à réaliser page 1/6
- Descriptif des travaux page 2/6
- Déroulement des travaux
- Fiche contrat N°1 page 3/6
- Fiche contrat N°2 page 4/6
- Plans de l'ouvrage page 5/6
- Plans de l'ouvrage page 6/6



PERSPECTIVE DE L'EPREUVE

(Schéma à titre indicatif)

CODE EPREUVE :		EXAMEN : BP	SPECIALITE : Carrelage mosaique	
SESSION 2006	SUJET	*EPREUVE* : E2 ETUDE DE REALISATION ET MISE EN OEUVRE		Calculatrice autorisée :
Durée : 20H		Coefficient : 7	N° sujet :	Page : 1 / 6

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Revêtement de sol :

- Revêtement grés émaillé 10 x 10 réalisé en pose scellée sur forme de pose de 4 cm d'épaisseur (Appareillage du tapis 10 x 10 clair et bordure 10 x 10 foncé), jointoyé au mortier à joints gris.

Revêtement mural :

3 Bordures (parties grisées) : plaquettes de parement rouge

Losange : Plaquettes de parement émaillées bleues

Remplissage : Coupe de pierre sur panneau gauche et diagonale sur panneau droit en grés émaillés 10x20 jointoyé au mortier à joints.

- Revêtement en pierres reconstituées de plusieurs modules en pose collée, jointoyé au mortier spécial. (Réf : Pierreajoint) partie droite du soubassement.
- Les différents revêtements seront implantés suivant les axes des supports à recouvrir.
- Les revêtements muraux seront collés au mortier colle blanc C2.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Temps d'exécution conseillé :

1er Jour	6H	• Décodage du sujet • Implantation et réalisation du revêtement mural (panneau de droite en 1er)
2ème Jour	Matin 3h Après midi 4h	• Suite du revêtement mural - Epreuve E3
3ème Jour	7h	– Soubassement + Sol
4ème Jour	4H	• Jointoiement des revêtements. • Finitions • Nettoyage

Respecter l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Référentiel		FICHE CONTRAT N °1	THEME : REALISER UN REVETEMENT VERTICAL COLLE		
Savoir					
Faire	Associé	On Donne	On Demande	On Exige	On Evalue
C3		Les plans Le descriptif Le support Les matériaux et produits de mise en œuvre • colle en pâte • grés émaillés 10 x 20 beige • mortier de jointement • la pierre reconstituée • les plaquettes de parement • produits à joints blancs ou gris clair pour le grès émaillé et produit monocouche ton pierre pour parement rustique (avec une finition lissée) ou • chaux + sable industriel n°1	Réaliser le revêtement mural collé avec plaquettes de parement et pierres reconstituées et grés émaillé Organisation du poste de travail (évaluation en cours d'épreuve par le jury) Présenter un ouvrage rendu et fini	- Une pose selon le respect des règles de l'art. - Le respect de l'implantation et des différents calepinage. - Le respect des cotes. - Le respect de l'aplomb du niveau et de l'alignement des joints. - La qualité des coupes. - La régularité des joints. - Le respect de la planéité du revêtement - Un jointement net et propre de l'ensemble - Une organisation rationnelle. - Une qualité de propreté de l'ensemble. - Un ouvrage net et complet.	/ / / / / / / / /

Total sur /140

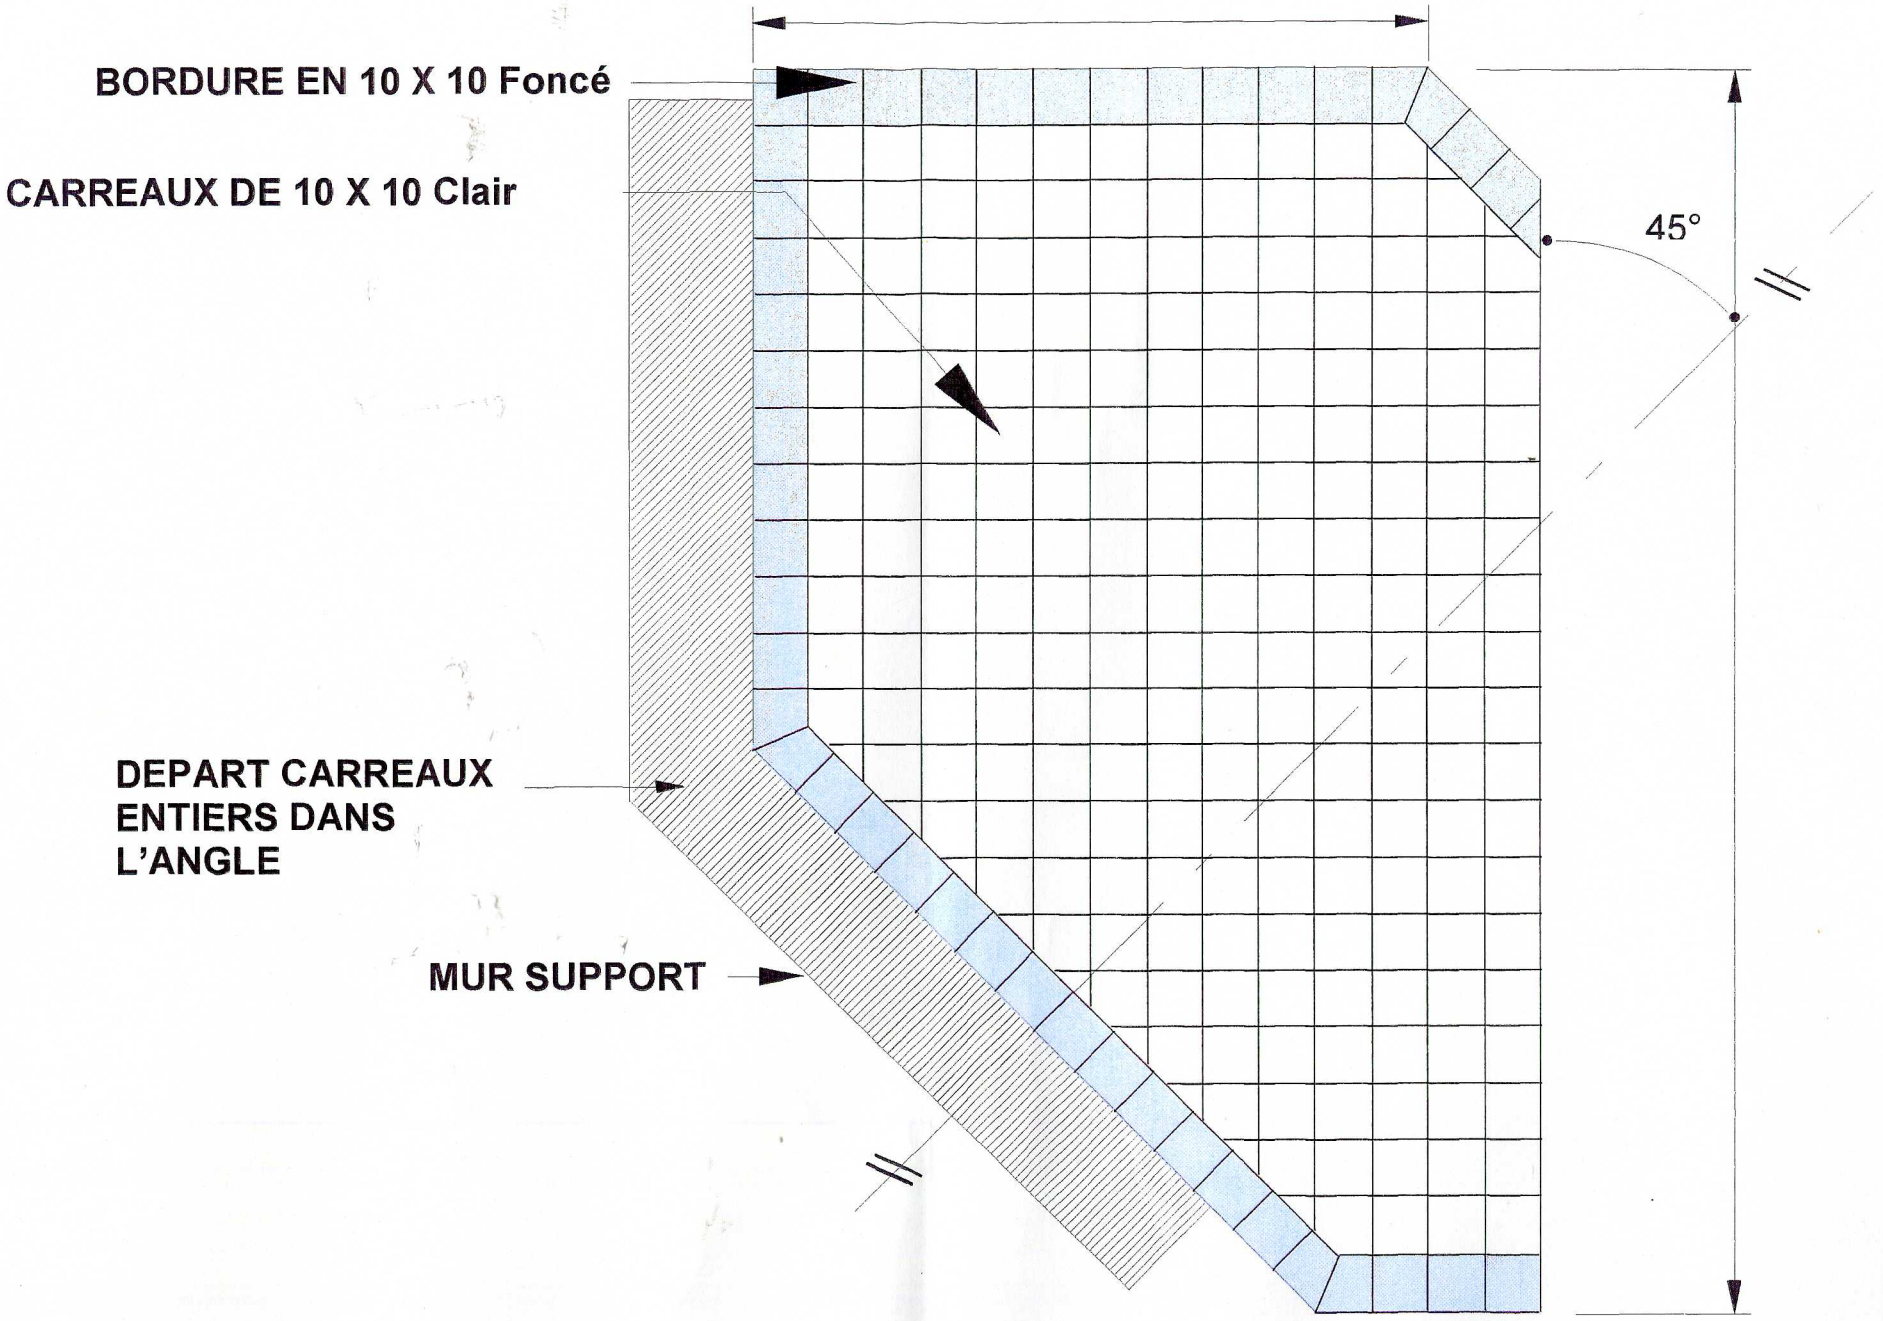
Référentiel		FICHE CONTRAT N °2	THEME : REALISER UN REVETEMENT DE SOL SCELLE		
Savoir					
Faire	Associé	On Donne	On Demande	On Exige	On Evalue
		Les plans Le descriptif Les matériaux et produits de mise en œuvre • sable • BATICIM OU MULTIBAT • revêtements grés émaillé - 10 x 10 – 2 tons • produits à joints de 3 mm (gris foncé) - mortier à joints gris	Réaliser le revêtement de sol scellé Organisation du poste de travail (évaluation en cours d'épreuve par le jury) Présenter un ouvrage rendu et fini	- Une couche de sable damé. - Une pose selon le respect des règles de l'art. - Le respect de l'implantation et du calepinage. - Le respect des plans - Le respect des niveaux et de la planéité + ou – 2 mm. - La qualité de scellement des carreaux. - Le jointement net et propre de l'ensemble. - La régularité et l'alignement des joints (3 mm) - Une organisation rationnelle. - Une qualité de propreté de l'ensemble pendant la réalisation. - Un ouvrage net et complet.	/ / / / /

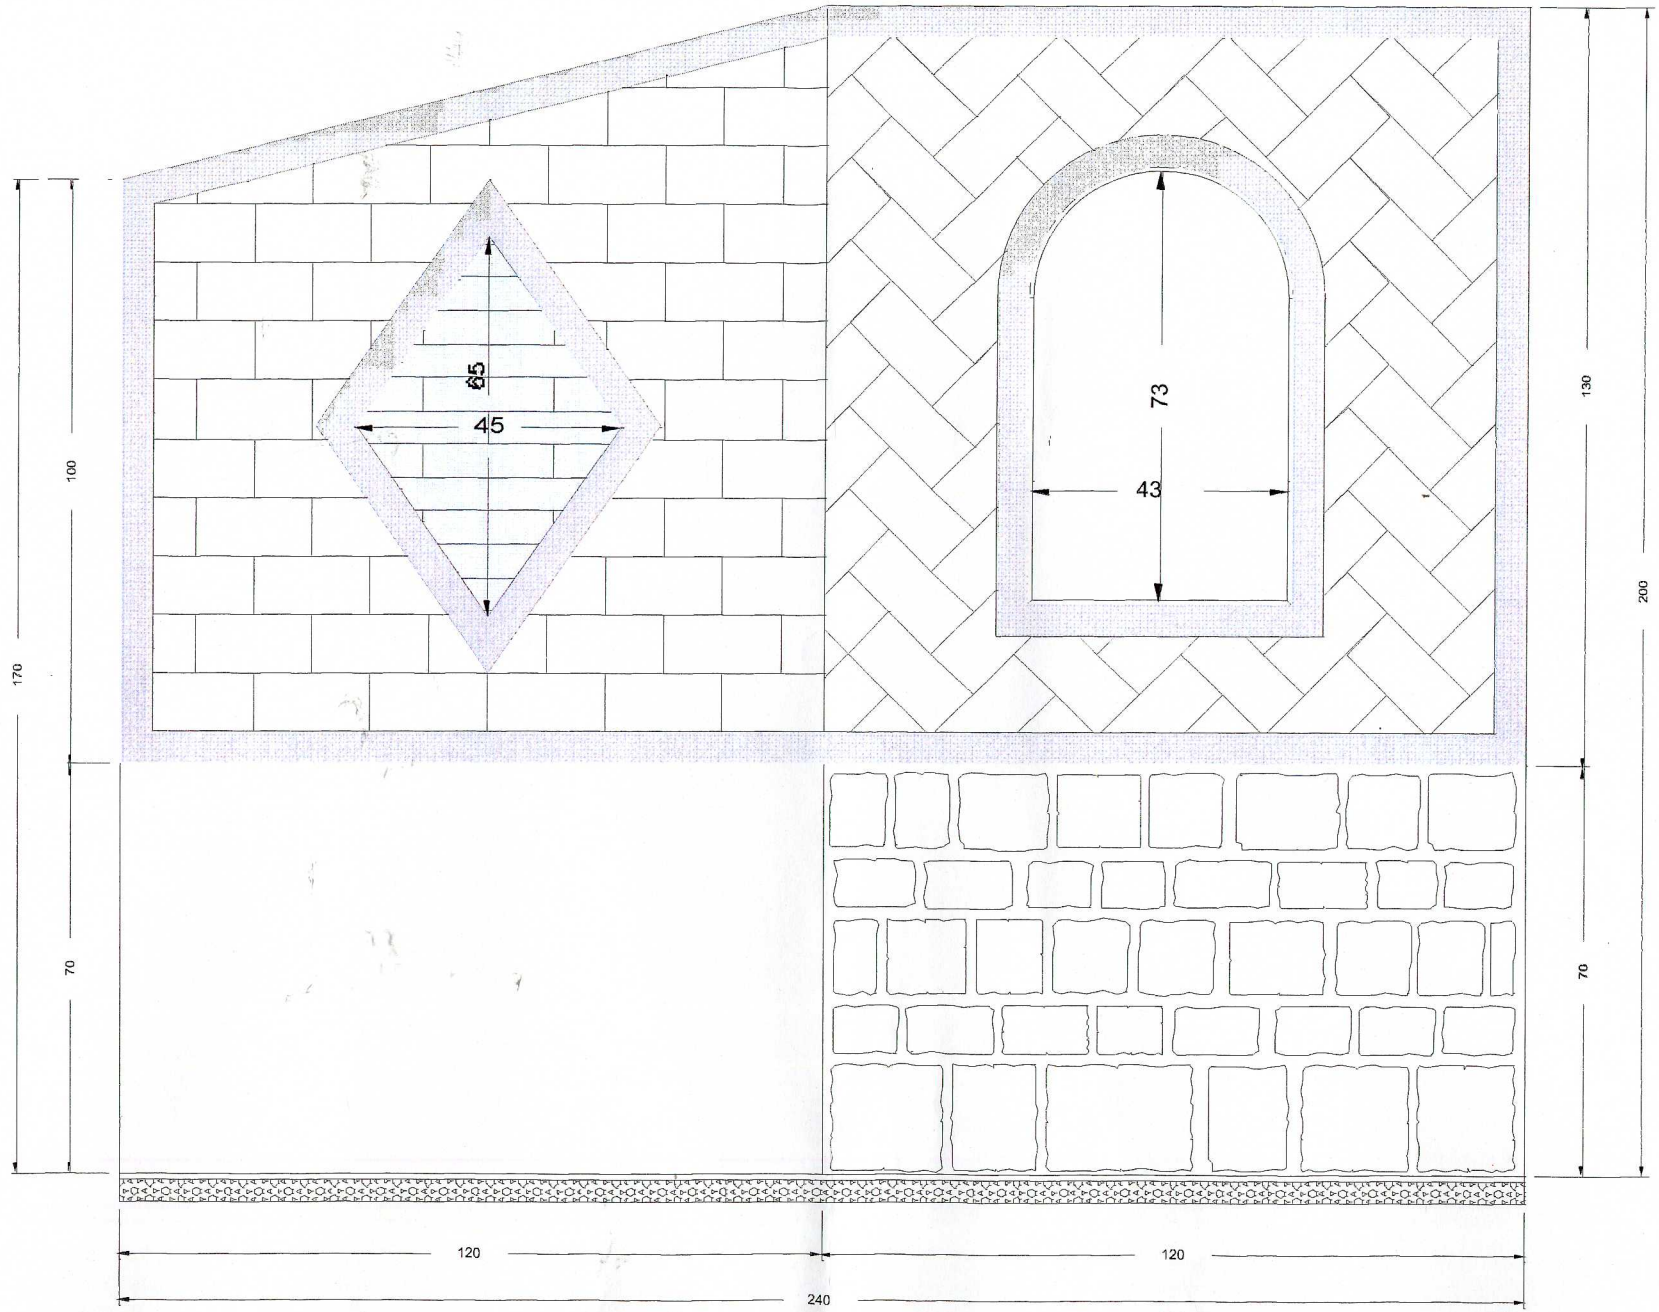
Total sur /80

Total Contrat 1 sur /140 + Total Contrat 2 sur /80 = /220

Total sur /220

Note sur /20


BORDURE EN 10 X 10 Foncé
CARREAUX DE 10 X 10 Clair
45°
DEPART CARREAUX ENTIERS DANS L'ANGLE
MUR SUPPORT


65
45
73
43
170
100
70
130
200
70
120
120
240

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.
